ABF) freudenberg | am weihberg 6 | 52428 jülich | www.ABF-freudenberg.de

#005

Projekt: KG-NH-J-06 Pfarrheim Neuenhausen - 001TerminplanPfarrheim

Zeitraum: 07.04.2009 - 13.07.2010

Datum: 01.10.2009
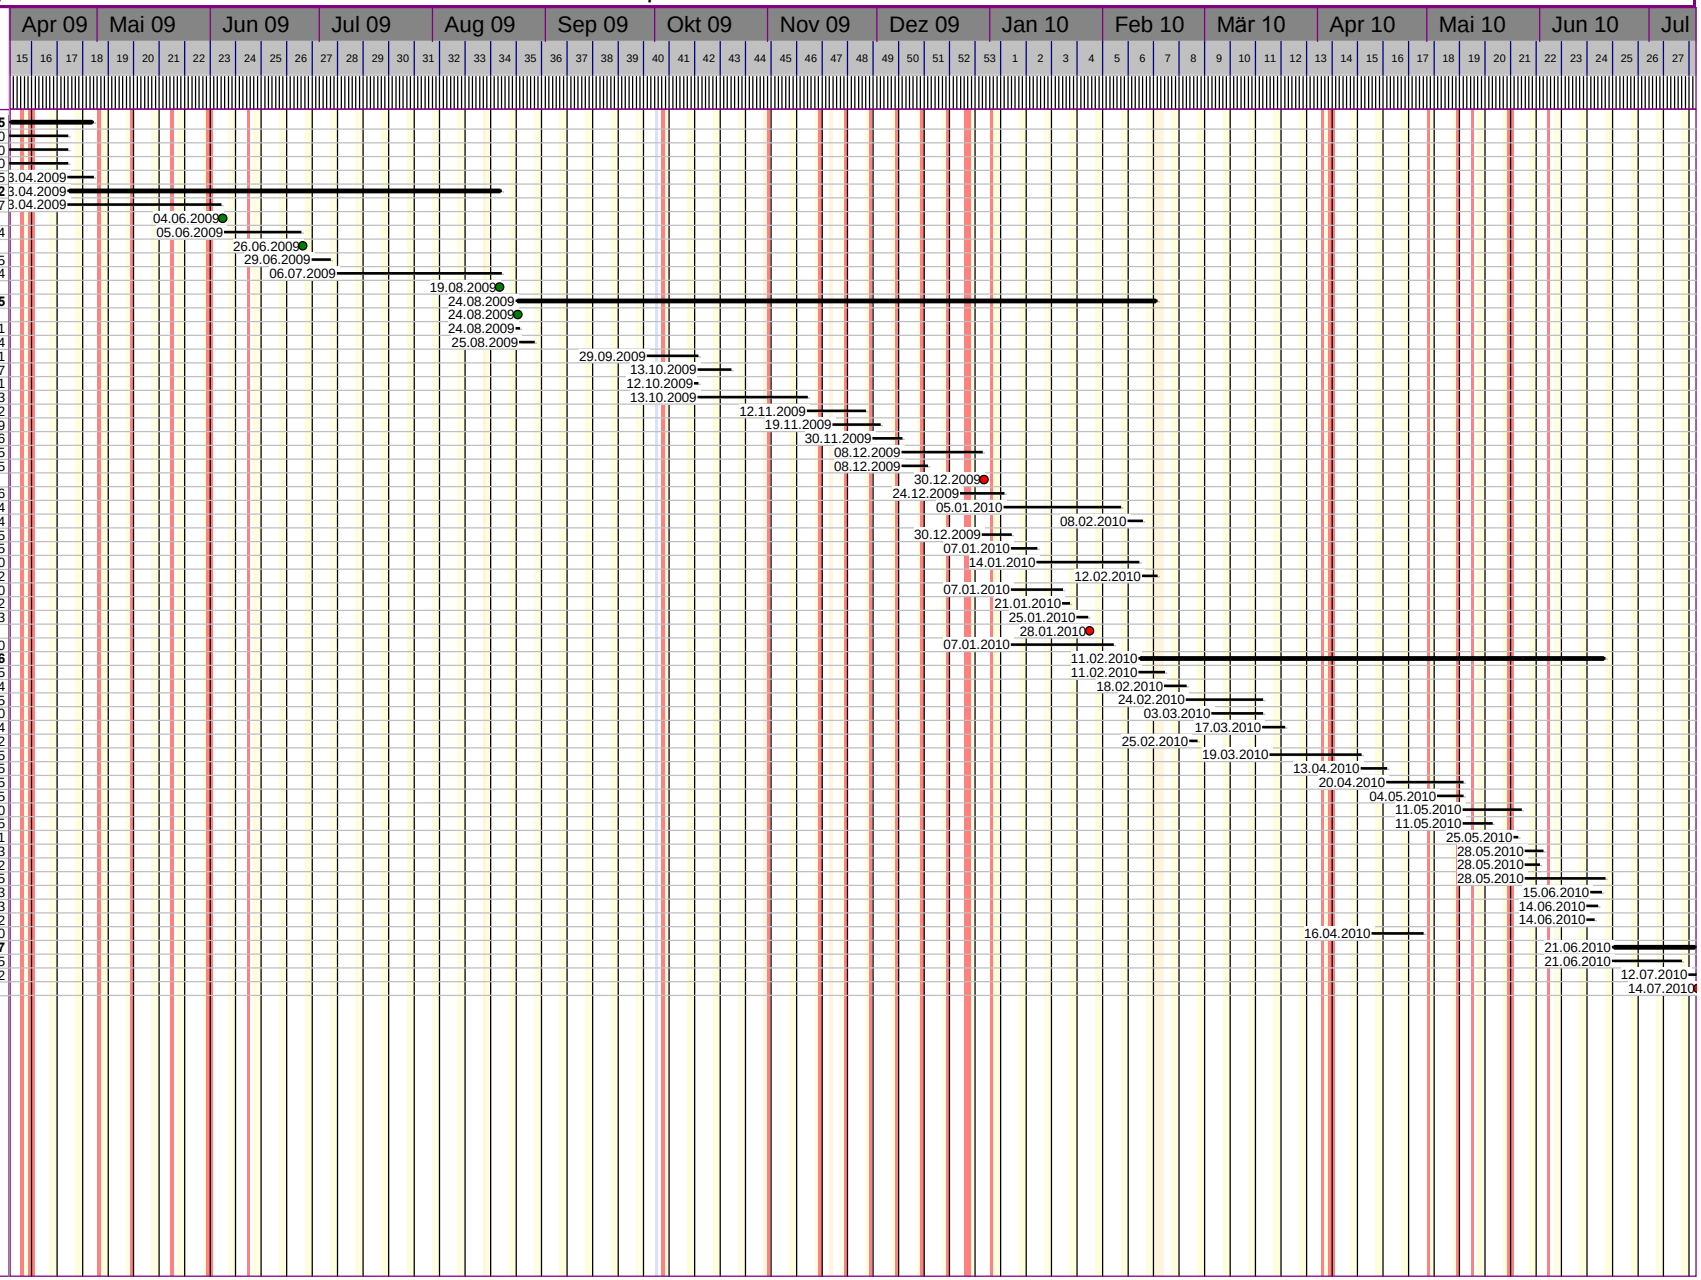
Nr.:	Name:	
1	**WERKPLANUNG**	**15**
1.1	Statik / Positionspläne	10
1.2	Schlitzpläne	10
1.3	Außenanlagenplan	10
1.4	Fertigstellung Werkplanung ABF)	5
2	**AV (A)**	**82**
2.1	Erstellung der LV	27
2.2	Bereitstellung der LV	
2.3	Kalkulationzeit	14
2.4	Submission	
2.5	Prüfen und Werten der LV	5
2.6	Genehmigung GV / Vergaben	34
2.7	Große Finanzausschusssitzung	
3	**BAUARBEITEN / Rohbau**	**105**
3.1	Baubeginn	
3.2	Vorbereitende Arbeiten	1
3.3	Abbruch und Sicherung	4
3.4	Bohrpfahlwand einschl. Rückvera.	11
3.5	Aushärten und Spannen	7
3.6	Baustelleneinrichtung	1
3.7	Aushub mit Verbau / Unterfangung	23
3.8	Bodenplatte	12
3.9	Keller	9
3.10	Kellerdecke	6
3.11	Erdgeschoss	15
3.12	Anfüllen Keller	5
3.13	GRUNDSTEINLEGUNG	
3.14	Gerüst Außen	6
3.15	Gerüst vorhalten	24
3.16	Gerüst Verlängerung	4
3.17	EG Decke	5
3.18	Attika	5
3.19	Verblendung	20
3.20	Träger ziehen, Holz Rückbau	2
3.21	Binder auflegen	10
3.22	Decke über Saal	2
3.23	Zimmer- und Holzbauarbeiten	3
3.24	RICHTFEST	
3.25	Dachdecker	20
4	**BAUARBEITEN / Ausbau**	**86**
4.1	Fenster Außentüren	5
4.2	Trockenbau 1/2	4
4.3	Rohinstallation / HSL	15
4.4	Rohinstallation / E	10
4.5	Trockenbau 2/2	4
4.6	Zargen	2
4.7	Putzarbeiten	15
4.8	Estricharbeiten	5
4.9	Trocknung Estrich	15
4.10	Fliesenarbeiten / Wand	5
4.11	Fliesenarbeiten / Boden	10
4.12	Parkett Saal	5
4.13	Montage WC Trennwände	1
4.14	Montage Sakristeieinrichtung	3
4.15	Montage Mobielwand	2
4.16	Malerarbeiten	15
4.17	Türblätter	3
4.18	Fertiginstallatin / HSL	3
4.19	Fertiginstallatin / E	2
4.20	Landschaftsbauarbeiten	10
5	**FERTIGSTELLUNG**	**17**
5.1	Restarbeiten	15
5.2	Gebäudereinigungsarbeiten	2
5.3	Übergabe an den Bauherrn
